

Avance Plan de Reconstrucción

Post Terremoto y Tsunami 16 Septiembre 2015



Gobierno Regional de Coquimbo

Marzo del 2017



ANTECEDENTES



Detalle de viviendas afectadas, Informe SERVIU a Febrero 2017.

Etiquetas de fila ▾	2 Daño REPARABLE LEVE	3 Daño REPARABLE MODERADO	4 Daño REPARABLE MAYOR	5 Daño NO REPARABLE	Total general
Choapa	1023	817	769	779	3388
CANELA	253	183	234	355	1025
Illapel	500	480	333	247	1560
Los Vilos	18	8	7	10	43
Salamanca	252	146	195	167	760
Elqui	245	326	388	311	1270
Andacollo	55	57	72	58	242
Coquimbo	145	166	142	135	588
La Serena	8	10	33	29	80
Paihuano	8	7	23	26	64
Vicuña	29	86	118	63	296
Limari	1058	880	1252	1158	4348
Combarbala	272	226	294	352	1144
Monte Patria	317	273	381	383	1354
Ovalle	239	200	290	255	984
Punitaqui	146	107	176	128	557
Rio Hurtado	84	74	111	40	309
Total general	2326	2023	2409	2248	9006



ETAPA DE EMERGENCIA

Hacia las Personas Damnificadas

- **Entrega de insumos de emergencia** (cajas de alimentos, agua, carpas, colchones, frazadas, kit de aseo, entre otros).
- **Bono Enseres**, ayuda económica que empezó a entregarse a 9 días de ocurrida la catástrofe, consistente en 1 millón de pesos en el caso de los afectados por el tsunami más terremoto, y 500 mil pesos para los damnificados por el terremoto.
4.383 bonos enseres entregados, equivalentes a M\$ 2.701.000.

Vivienda

- **1.684 viviendas de emergencia entregadas**, 1.603 viviendas construidas (**95% avance**).
- **1.000 baños entregados**, 566 baños construidos (**57% avance**.)
- **M\$ 6.736.000 traspasados** por concepto de viviendas de emergencia y baños entregados.
- **642 demoliciones y 459 instalaciones de viviendas**, lo que equivale a un monto transferido de **M\$ 1.684.440**.
- **72 bonos de acogida** por **M\$ 52.800**.
- **2.216 subsidios banco de materiales Daño 2 Reparable Leve** entregados a Febrero 2017.
- **1.364 subsidios asignados para Reparar Viviendas con Daño 3 Reparable Moderado**, 664 Proyectos ya aprobados y 700 en preparación.
- **1.441 subsidios asignados para Reparar Viviendas con Daño 4 Reparable Mayor**, 116 iniciados, 3 renunciadas, 1.106 sin inicio y 216 Terminados.
- **1.622 subsidios asignados de Viviendas con Daño 5 No Reparable**, 118 Proyectos en ejecución, 1.376 Sin inicio y 128 Terminados.



Situación Viviendas de Emergencia

PROVINCIA	COMUNA	VIVIENDA ENTREGADAS	VIVIENDA CONSTRUIDAS	EN ACOPIO	% Avance Construcción Viviendas respecto a Viviendas Entregadas
ELQUI	LA HIGUERA	-	-	-	-
	LA SERENA	12	7	5	58%
	COQUIMBO	66	36	30	55%
	VICUÑA	40	40	0	100%
	PAIHUANO	17	17	0	100%
	ANDACOLLO	23	23	0	100%
TOTAL ELQUI		158	123	35	78%
LIMARÍ	OVALLE	99	96	3	97%
	RÍO HURTADO	33	33	0	100%
	MONTE PATRIA	231	230	1	100%
	COMBARBALÁ	299	295	4	99%
	PUNITAQUI	101	97	4	96%
TOTAL LIMARÍ		763	751	12	98%
CHOAPA	ILLAPEL	234	214	20	91%
	CANELA	340	326	14	96%
	LOS VILOS	6	6	0	100%
	SALAMANCA	183	183	0	100%
TOTAL CHOAPA		763	729	34	96%
TOTAL REGIONAL		1.684	1.603	81	95%



Brechas Ministerio del Interior

Beneficios denominados Brechas Pendientes de entrega

- Viviendas de Emergencia.
- Bonos de Enseres.
- Aporte Extraordinario (\$300.000).
- Aporte Extraordinario a Familias que perdieron su fuente Laboral (\$400.000).
- Aporte a Familias afectadas tsunami sin solución habitacional.

PROVINCIA	COMUNA	Brechas de Viviendas de Emergencia	Brechas de Bonos de Enseres	Brechas de Aporte extraordinario (\$300.000)	Brechas de Aporte extraordinario (\$400.000)	Familias afectadas tsunami sin solución habitacional	Total
ELQUI	LA HIGUERA	0	0	0	0	0	0
	LA SERENA	8	2	0	0	0	10
	COQUIMBO	42	104	2	0	29	177
	VICUÑA	8	3	0	0	0	11
	PAIHUANO	23	1	0	0	0	24
	ANDACOLLO	11	0	34	0	0	45
TOTAL ELQUI		92	110	36	0	29	267
LIMARÍ	OVALLE	181	115	0	18	0	314
	RÍO HURTADO	14	1	152	0	0	167
	MONTE PATRIA	288	97	134	0	0	519
	COMBARBALÁ	92	116	72	0	0	280
	PUNITAQUI	46	35	108	0	0	189
TOTAL LIMARÍ		621	364	466	18	0	1469
CHOAPA	ILLAPEL	79	67	5	0	0	151
	CANELA	76	48	50	0	0	174
	LOS VILOS	2	10	0	0	0	12
	SALAMANCA	82	13	229	0	0	324
TOTAL CHOAPA		239	138	284	0	0	661
TOTAL REGIONAL		952	612	786	18	29	2397

Brechas Ministerio del Interior

Avance en Plataforma Ministerio del Interior

PROVINCIA	COMUNA	Brechas de Viviendas de Emergencia				Brechas de Bonos de Enseres				Brechas de Aporte extraordinario (\$300.000)			
		Documentación Completa	Documentación Parcial	Renuncias	No tramitadas	Documentación Completa	Documentación Parcial	Renuncias	No tramitadas	Documentación Completa	Documentación Parcial	Renuncias	No tramitadas
ELQUI	LA HIGUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LA SERENA	0	0	0	8	0	0	0	2	0	0	0	0
	COQUIMBO	0	1	0	41	50	0	0	54	2	0	0	0
	VICUÑA	0	0	8	0	0	0	3		0	0	0	0
	PAIHUANO	0	0	0	23	0	0	0	1	0	0	0	0
	ANDACOLLO	0	0	0	11	0	0	0		0	0	0	34
TOTAL ELQUI		0	1	8	83	50	0	3	57	2	0	0	34
LIMARÍ	OVALLE	0	0	0	181	58	0	0	57	0	0	0	0
	RÍO HURTADO	0	0	0	14	0	0	1	0	117	0	6	29
	MONTE PATRIA	0	10	0	278	88	0	0	9	73	0	0	61
	COMBARBALÁ	0	0	0	92	26	0	0	90	68	0	0	4
	PUNITAQUI	8	0	0	38	33	0	0	2	84	0	0	24
TOTAL LIMARÍ		8	10	0	603	205	0	1	158	342	0	6	118
CHOAPA	ILLAPEL	0	42	18	19	64	1	2	0	2	0	0	3
	CANELA	3	41	0	32	22	0	0	26	41	0	0	9
	LOS VILOS	0	0	0	2	6	0	0	4	0	0	0	0
	SALAMANCA	0	2	18	62	0	6	0	7	67	107	0	55
TOTAL CHOAPA		3	85	36	115	92	7	2	37	110	107	0	67
TOTAL REGIONAL		11	96	44	801	347	7	6	252	454	107	6	219

Casos Especiales:

- Brecha de Aporte Extraordinario de \$400.000, Comuna de Ovalle: 15 Beneficiarios tienen su documentación completa y 3 aún no han sido tramitados.
- Familias afectadas tsunami sin solución habitacional, Comuna de Coquimbo: 28 Beneficiarios tienen su documentación completa y uno no ha sido tramitado.



Datos Iniciales del PLAN de RECONSTRUCCIÓN

- Horizonte del Plan : **2020**
- Territorialidad a nivel comunal

Resumen de la Oferta Pública:

Cantidad de Iniciativas de Inversión: **113**

Monto Total de Plan de Reconstrucción: **M\$ 143.713.935**





Servicios Públicos que participan del Plan de Reconstrucción:

- Gobierno Regional de Coquimbo
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Obras Públicas
- Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes
- Ministerio de Minería
- Ministerio de Bienes Nacionales



Datos por Eje de Reconstrucción

VIVIENDA

SALUD

EDUCACIÓN Y CULTURA

INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO

ECONOMÍA

PESCA ARTESANAL

PEQUEÑA MINERÍA


AGRICULTURA

BORDE COSTERO

Iniciativas MINVU (Proyectos de Urbanización)

Nº	COMUNA	Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa)	COSTO APROXIMADO M\$	CODIGO BIP	ESTADO DE LA INICIATIVA	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
1	Coquimbo	Reposición Av. Costanera De Coquimbo (Diseño)	\$ 2.661.969	30425976-0	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	DOP diseñará y ejecutará el Tramo 1 del proyecto costanera donde se construirá muro verde olas como la plataforma vial. MINVU diseñará y ejecutará los tramos 2 y 3, desde puente el Culebrón hasta calle Peñuelas Norte. SERVIU ejecutará toda la ciclovía. Decreto de identificación presupuestaria totalmente tramitado. Apertura de licitación para el día 03-03-2017. Fecha obtención de RATE 02-09-2016 . Posible contratación en la semana del 20 de marzo.
		Reposición Av. Costanera De Coquimbo (Ejecución)			NO INICIADO	Ejecución , a partir de segundo semestre 2017, al terminar Diseño (Se modifico proyección para iniciar ejecución en 2018)
2	Combarbalá	Mejoramiento Plaza De Armas De Combarbalá (Ejecución)	\$ 700.458	30277373-0	LICITACIÓN	Diseño finalizado y aprobado. Identificación Presupuestaria totalmente tramitada . En proceso de adjudicación y contratación en tramite.
3	Punitaqui	Mejoramiento Plaza Pueblo Viejo, Punitaqui (Ejecución)	\$ 687.383	30082413-0	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	Diseño se encuentra con Rate RS por parte de MIDESO. Con solicitud de identificación presupuestaria en trámite. Se preparan antecedentes para licitación.
4	Los Vilos	Reposicion Paseo Peatonal De Los Vilos (Ejecución)	\$ 513.400	30464688-0	EVALUACIÓN MDS	Diseño contratado mediante recursos PGC Reconstrucción. Se encuentra aprobado técnicamente. Se esta trabajando en obtención del RS, actualmente se subsana observación de MIDESO, estado FI.
5	Canela	Mejoramiento Espacio Público Rosa Vicencio (Ejecución)	\$ 721.850	30117989-0	FORMULACIÓN	Proyecto a la espera de aprobación técnica por parte del SERVIU. Inicio programado segundo semestre 2017.
6	Canela	Pavimentación De Calle Silvano Contreras En La Comuna De Canela (Ejecución)	\$ 508.454	30390472-0	EJECUCIÓN	Proyecto incluido en el 25° Pavimentos Participativos (XI agrupación), se suplementó el llamado del programa, para incluir este proyecto. Proyecto adjudicado, inicia obras en el mes de Enero de 2017.
7	Salamanca	Construcción Paseo Peatonal Costanera Río Choapa Etapa Poniente. (Ejecución)	\$ 687.431	30464690	FORMULACIÓN	Diseño se esta realizando por PGC. Por el aumento de costo del proyecto, se divide en dos etapas, aprobándose su primera técnicamente por SERVIU ,se trabaja en obtencion RS por parte de MIDESO.

Datos por Eje de Reconstrucción



SALUD

EDUCACIÓN Y CULTURA

INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO

ECONOMÍA

PESCA ARTESANAL

PEQUEÑA MINERÍA

AGRICULTURA

BORDE COSTERO

Iniciativas MINVU (Proyectos de Urbanización)

Nº	COMUNA	Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa)	COSTO APROXIMADO M\$	CODIGO BIP	ESTADO DE LA INICIATIVA	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
8	Ovalle - Combarbalá - Illapel - Canela	Conservación Muros De Contención Intervalos - Illapel, Canela, Sotaquí y Ovalle (Ejecución)	\$ 1.597.330	30460052-0	EJECUCIÓN	Const. Muros de Contención Calle Alcalde Olivares Etapa I Canela avance 90%. Const. Muros de Contención Etapa II Comuna de canela , avance 72%. Demolición, reparación y reconstrucción de Muros de contención en la comuna de canela varias calles, 75% avance.. Construcción Muros de Contención varias calles Illapel, avance del 65%. Construcción Muros de Contención varias calles Ovalle, 2% de avance. Construcción de Muros de Contención Ferronor, Sotaquí Etapa II, sin número de propuesta, a la espera de antecedentes para preparar licitación.
9	Coquimbo	Construccion Vias Evacuacion Zona Costera La Serena y Coquimbo	\$ 5.203.570	30106198-0	EJECUCIÓN 26% avance	Proyecto consiste en 9 vías de Evacuación de las cuales 5 están ejecutadas Los Corsarios, Amunátegui, Los Lúcumos, Los Jardines, Amanecer y las cuatro restantes se encuentran sus terrenos expropiados (Florencio Sánchez, Los Perales , Los Nísperos , Los Membrillos).
10	Canela - Ovalle - Combarbalá - Monte Patria - Illapel	Conservación De Muros Interviviendas Provincia Del Choapa (Ejecución)	\$ 770.000	30464650-0	EJECUCIÓN	Diseño a cargo de equipo de reconstrucción SERVIU, terminado. Ejecución a partir de Segundo semestre 2016, financiamiento a través de saneamiento de poblaciones. Se solicito identificación presupuestaria, se esta analizando en la DIPRES. Primera etapa con apertura fecha 16-12-2016, mediante resolución n°2531, segunda etapa apertura con fecha 05-01-17, aun sin adjudicar, a la espera de decreto presupuestario para adjudicar.



Datos por Eje de Reconstrucción



Iniciativas MINVU (Instrumentos de Planificación Territorial)

Nº	COMUNA	Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa)	COSTO APROXIMADO M\$	CODIGO BIP	ETAPA	ESTADO DE LA INICIATIVA
11	Coquimbo	Elaboración Plan Baquedano y Propuesta Modificación P.R.C.			DISEÑO	(*)
12	Vicuña - Paihuano	Actualización PRI Elqui Estudio De Riesgos Paihuano - Vicuña (Consultoría)	\$ 100.000	30401075-0	DISEÑO	EJECUCIÓN 20% avance
13	Coquimbo	Actualización PRI Elqui Estudio de Riesgo Bahía de Coquimbo (Consultoría)	\$ 98.400	30382872-0	DISEÑO	EJECUCIÓN

(*) La iniciativa se replanteó para partir mediante la contratación de tres productos mediante pago de proyectos a través de PGC, los que servirán como estudio base para el desarrollo del proyecto. 1: Catastro Urbano Línea Base en Sector Baquedano, valor contrato M\$8.000, con fecha 15.12.2016 se hace entrega estudio final. 2: Levantamiento Mapa de Actores Sector Baquedano y Conform. Mesa, valor contrato M\$6.000, con fecha 15.12 2016 se hace entrega estudio final. 3: Factibilidad Financiera, Técnica y Normativa del Proyecto Habitacional en sector Baquedano Coquimbo, valor contrato M\$2.500 , con fecha 05.12.2016 se hace entrega del estudio..



Datos por Eje de Reconstrucción




SUBSIDIOS SERVIU (Viviendas)

Nº	COMUNA	Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa)	Costo Aproximado M\$	Avance Financiero	Afectación	Viviendas Afectadas (Feb 2017)	Viviendas Atendidas (Feb 2017)	Terminadas	En Ejecución	En Preparación	Avance de Gestión
14	Todas Las Comunas	Reparaciones Mayores y moderadas de Viviendas Daño 2 (Reparable Leve), Daño 3 (Reparable Moderado) y Daño 4 (Reparable Mayor)	34.133.125	12 %	Daño 2	2326	2216	1904	176	136	82 %
					Daño 3	2023	2023	329	193	1064	16 %
					Daño 4	2409	1441	216	116	1106	9 %
15	Todas Las Comunas	Sistema Integrado de Subsidio Daño 5 (No Reparable)	28.515.912	9 %	Daño 5	2248	1622	128	118	1376	6 %
16	Todas Las Comunas	Fondo Solidario de Vivienda Daño 5 (No Reparable)	8.681.055								
17	Coquimbo	Compra de Terrenos Comité de Allegados sector Baquedano	856.000	100 %							
18	Coquimbo	Tasaciones Terrenos sector Baquedano	3.000.000	47 %							



Datos por Eje de Reconstrucción



VIVIENDA	SALUD	EDUCACIÓN Y CULTURA	INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO	ECONOMÍA	PESCA ARTESANAL	PEQUEÑA MINERÍA	AGRICULTURA	BORDE COSTERO
----------	-------	---------------------	-----------------------------------	----------	-----------------	-----------------	-------------	---------------

Iniciativas MIDESO (Viviendas)

Nº	COMUNA	Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa)	COSTO APROXIMADO M\$	ESTADO DE LA INICIATIVA	% DEL GASTO HOY	COMENTARIOS
1	Andacollo	PROGRAMA HABITABILIDAD Implementar soluciones en el ámbito de habitabilidad relacionadas con reparaciones de techumbres, módulos, instalaciones eléctricas, pisos, agua potable, baños, camas, mobiliario, Etc.	\$ 69.550	TERMINADO	98%	Proyecto ejecutado en un 100%, (Soluciones constructivas y de equipamiento)
2	Canela		\$ 111.800	TERMINADO	99%	Proyecto ejecutado en un 100%, (Soluciones constructivas y de equipamiento)
3	Combarbalá		\$ 82.350	EJECUCIÓN	18%	En ejecución, fecha de termino el 12-02-17
4	Coquimbo		\$ 138.450	TERMINADO	26%	Proyecto ejecutado en un 100%, (Soluciones constructivas y de equipamiento)
5	Illapel		\$ 113.125	EJECUCIÓN	56%	En ejecución, fecha de termino el 12-02-17
6	Los Vilos		\$ 84.375	EJECUCIÓN	17%	En ejecución, fecha de termino el 12-02-17
7	Monte Patria		\$ 58.500	EJECUCIÓN	69%	En ejecución, fecha de termino el 12-02-17
8	Ovalle		\$ 78.300	EJECUCIÓN	19%	En ejecución, fecha de termino el 12-02-17
9	Paihuano		\$ 37.500	TERMINADO	84%	Proyecto ejecutado en un 100%, (Soluciones constructivas y de equipamiento)
10	Punitaqui		\$ 54.000	EJECUCIÓN	96%	Proyecto ejecutado en un 100%, (Soluciones constructivas y de equipamiento)
11	Río Hurtado		\$ 39.000	TERMINADO	99%	Proyecto ejecutado en un 100%, (Soluciones constructivas y de equipamiento)
12	Salamanca		\$ 82.550	EJECUCIÓN	7%	En ejecución, fecha de termino el 12-02-17
13	Vicuña		\$ 78.000	TERMINADO	99%	Proyecto ejecutado en un 100%, (Soluciones constructivas y de equipamiento)



Datos por Eje de Reconstrucción



Iniciativas BB.NN. (Viviendas)

Nº	COMUNA	Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa)	COSTO APROXIMADO M\$	CODIGO BIP	ESTADO DE LA INICIATIVA	% DEL GASTO HOY	COMENTARIOS
1	Todas Las Comunas	Catastro, Estudio de Títulos y Saneamiento de Títulos de viviendas dañadas por el Terremoto Y Tsunami.	\$ 151.314	30434574-0	NO INICIADO	0 %	Se está a la espera de asignación de recursos para comenzar la ejecución.



Datos por Eje de Reconstrucción



Iniciativas Reparación Infraestructura Hospitalaria por parte del Ministerio de Salud.-

Nº	COMUNA	Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa)	COSTO APROXIMADO M\$	CODIGO BIP	ESTADO DE LA INICIATIVA	% DEL GASTO HOY	COMENTARIOS
1	Coquimbo	Demolición Torre Antigua	\$ 994.861	30433830-0	EJECUCIÓN	100%	Obra ejecutada vía trato directo en proceso recepción
2	Coquimbo	Hospital Construcción Acelerada	\$ 3.214.504	30433830-0	LICITACIÓN	0%	Licitación declarada desierta por inadmisibilidad de ofertas. Nueva licitación en proceso
3	Coquimbo	Habilitación UCA y Endoscopia	\$ 1.230.286	30433830-0	EJECUCIÓN	35%	Contrato en ejecución
4	Coquimbo	Habilitación Esterilización	\$ 200.000	30433830-0	FORMULACIÓN	0%	Anteproyecto elaborado, se debe licitar el año 2017
5	Coquimbo	Otros trabajos	\$ 2.130.349	30433830-0	TERMINADO	100%	Diversos trabajos ejecutados entre 2015 - 2016
6	Ovalle	Conservación Post-Terremoto Hospital De Ovalle	\$ 481.980	30433829-0	TERMINADO	100%	Obra en estado de ejecución 100% realizada
7	Andacollo	Conservación Post-Terremoto Hospital De Andacollo	\$ 21.363	30433872-0	TERMINADO	100%	Obra en estado de ejecución 100% realizada
8	Illapel	Conservación Post-Terremoto Hospital De Illapel	\$ 327.560	30433827-0	TERMINADO	100%	Obra en estado de ejecución 100% realizada
9	Salamanca	Conservación Post-Terremoto Hospital De Salamanca	\$ 57.684	30433779-0	TERMINADO	100%	Obra en estado de ejecución 100% realizada
10	Combarbalá	Conservación Post-Terremoto Hospital De Combarbalá	\$ 81.119	30433824-0	TERMINADO	79%	Obra en estado de ejecución 100% realizada , queda con un saldo financiero pendiente de 21%



Datos por Eje de Reconstrucción



FRIL Estaciones Médico Rural (GORE).-

Nº	COMUNA	Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa)	COSTO APROXIMADO M\$	ESTADO DE LA INICIATIVA	COMENTARIOS
86	Andacollo	Fril Estaciones Médico Rural: Considera financiamiento para habilitación, reparación, reposición y/o construcción de EMR priorizadas por los Municipios.	\$ 36.993	SIN INICIAR	Sin Asignación Presupuestaria
87	Coquimbo		\$ 78.283		Sin Asignación Presupuestaria
88	Paihuano		\$ 44.476	SIN INICIAR	Sin Asignación Presupuestaria
89	Vicuña		\$ 48.265	SIN INICIAR	Sin Asignación Presupuestaria
90	Combarbalá		\$ 86.077	SIN INICIAR	Sin Asignación Presupuestaria
91	Monte Patria		\$ 99.502	SIN INICIAR	Sin Asignación Presupuestaria
92	Ovalle		\$ 75.152	SIN INICIAR	Sin Asignación Presupuestaria
93	Punitaqui		\$ 74.859	SIN INICIAR	Sin Asignación Presupuestaria
94	Río Hurtado		\$ 54.255	SIN INICIAR	Sin Asignación Presupuestaria
95	Canela		\$ 105.542	SIN INICIAR	Sin Asignación Presupuestaria
96	Illapel		\$ 97.016	SIN INICIAR	Sin Asignación Presupuestaria
97	Los Vilos		\$ 39.469	SIN INICIAR	Sin Asignación Presupuestaria
98	Salamanca		\$ 65.104	SIN INICIAR	Sin Asignación Presupuestaria



Datos por Eje de Reconstrucción



Iniciativas MOP

Nº	COMUNA	Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa)	COSTO APROXIMADO M\$	CODIGO BIP	ESTADO DE LA INICIATIVA	% DEL GASTO HOY	COMENTARIOS
1	Los Vilos	Construcción Muro Verteolas Costero Los Vilos Por Reconstrucción	\$ 1.832.819	30458672-0	EJECUCIÓN	57%	Contrato ejecutado por etapas (3 etapas).
2	Coquimbo	Construcción Caleta Coquimbo Por Reconstrucción	\$ 5.000.000	30427826-0	FORMULACIÓN	0%	Diseño interno DOP
3	Coquimbo	Construcción Del Muro Costanera Coquimbo Por Reconstrucción	\$ 4.000.000	30427824-0	FORMULACIÓN	0%	Diseño interno DOP
4	Coquimbo	Construcción Paseo Costero Sector Tongoy Etapa 1	\$ 3.469.515	30062603-0	TERMINADO	100%	Sin observaciones.
5	Coquimbo	Conservación Caleta Coquimbo 3 Etapa	\$ 700.000	30438722-0	EJECUCIÓN	0%	Se realiza por trato directo, como emergencia.
6	Coquimbo	Conservación Borde Costero Coquimbo	\$ 362.000	30464311-0	TERMINADO	80%	Se realiza por trato directo, como emergencia.
7	Provincial	Evaluación Daños Iglesias del Limarí, proponer medidas de reconstrucción y/o restauración	\$ 170.644	30136044-0	EJECUCIÓN	10%	Avance según lo programado.
8	Ovalle	Reparación De Daños Iglesia Sotaquí	\$ 300.000	30459237-0	FORMULACIÓN	0%	Iniciativa en reformulación para ficha de Conservación, para ser presentada directamente a DIPRES.

Datos por Eje de Reconstrucción



Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Cultural (CNCA)

Nº	COMUNA	Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa)	COSTO APROXIMADO M\$	ESTADO DE LA INICIATIVA	% DEL GASTO HOY	COMENTARIOS
1	Coquimbo	Adquisición de equipamiento para habilitación de la Casa de la Cultura de Coquimbo.	\$ 28.647	EJECUCIÓN	75	Licitación finalizada, a la espera de la rendición final y devolución de saldo
2	Coquimbo	reposición muro Casa de las Artes de Coquimbo.	\$ 100.408	EJECUCIÓN	50	Ejecución de obra en proceso. Se ha realizado el proceso de demolición del muro y refuerzo de estructura colindante.
3	Coquimbo	Habilitación Galería Chile Arte. Beneficiario: Corporación Patrimonio Etnográfico	\$ 39.405	EJECUCIÓN	67	Obra avanza según cronograma, se estan realizando las terminaciones y se espera terminar durante marzo
4	Vicuña	Reparación y restauración Casa dela Cultura de Vicuña.	\$ 88.545	EJECUCIÓN	67	Obra avanza según cronograma.
5	Ovalle	Mejoramiento integral edificio Ex Estación de trenes de Ovalle, Biblioteca Publica.	\$ 144.344	EJECUCIÓN	33	Obra avanza según cronograma. Se realizará una reitemizacion del proyecto para poder financiar obras complementarias necesarias para la correcta ejecución de la obra total
6	Salamanca	Reparación Centro Cultural y Deportivo Santa Rosa.	\$ 120.000	LICITACIÓN	0	La ejecución de este proyecto se encuentra detenida en su etapa inicial, a la espera de resolución de temas administrativos relacionados con la normativa vigente (emplazamiento y construcción del inmueble existente)

Datos por Eje de Reconstrucción



Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Educación (MINEDUC)

Nº	COMUNA	Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa)	COSTO APROXIMADO M\$	ESTADO DE LA INICIATIVA	% DEL GASTO HOY	COMENTARIOS
1	Coquimbo	Reparaciones Fachadas Y Gimnasio Diego Portales	\$ 162.899	EJECUCIÓN	50%	El proyecto actualmente se encuentra en estado de ejecución con un 95% de avance físico de obras de construcción, presentando un 35% de avance físico con respecto a la evaluación anterior, la proyección de gasto se mantiene. En espera de saldo de convenio.
2	Coquimbo	Reparación Cierre Perimetral Escuela Peñuelas	\$ 74.155	NO INICIADO	0%	El proyecto se encuentra en plataforma de postulación, sin cambios a la fecha manteniendo proyección de gastos y de ejecución de obras.
3	Coquimbo	Reparaciones Fachadas e Infraestructura Menor Escuela Coquimbo	\$ 191.359	EJECUCIÓN	50%	El proyecto actualmente se encuentra en estado de ejecución con un 50% de avance físico de obras de construcción, presentando un 45% de avance físico con respecto a la evaluación anterior, la proyección de gasto se mantiene. En espera de saldo de convenio.
4	Coquimbo	Mejoramiento Estructural Liceo Carmen Rodríguez Tongoy	\$ 200.000	NO INICIADO	0%	Municipalidad no ha presentado proyecto. SECREDOC, según análisis aprueba viabilidad de proyecto. sin cambios a la fecha manteniendo proyección de gastos y proyección de ejecución de obras.
5	Illapel	Habilitación Salas De Clases, Ss. Higiénicos Y Cocina Escuela Juan Carrasco Risco	\$ 192.916	EJECUCIÓN	50%	El proyecto presenta un 5% de avance físico en las obras civiles con respecto a la evaluación anterior, la proyección de gasto se mantiene. En espera de los antecedentes que enviará la Municipalidad para la valuación de nuevo emplazamiento por parte de Mineduc.
6	Illapel	Habilitación Circulaciones Cubiertas, Conexiones de SS. Básicos Y Recintos Administrativos Esc. San Rafael De Rozas	\$ 211.377	EJECUCIÓN	50%	El proyecto se encuentra con la ejecución finalizada y en espera de la recepción provisoria, manteniendo la proyección de gastos.
7	Canela	Construcción Segunda Etapa Escuela Provisoria de Canela Alta	\$ 700.070	EJECUCIÓN	50%	El proyecto cuenta con un avance de un 10% en las obras civiles y un 50% en los modulares a perímetro, logrando quedar en su totalidad los modulares. Se mantiene la Proyección de gastos, con respecto al seguimiento anterior.
8	Los Vilos	Conservacion Liceo Nicolas Federico Lohse	\$ 272.897	NO INICIADO	0%	SECREDOC realiza nuevas observaciones, con fecha 2 de Febrero de 2017 quedando en espera de que la municipalidad las resuelva, es por esta razón que la proyección de gastos cambia con respecto al seguimiento anterior.



Datos por Eje de Reconstrucción



Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Educación (MINEDUC)

Nº	COMUNA	Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa)	COSTO APROXIMADO M\$	ESTADO DE LA INICIATIVA	% DEL GASTO HOY	COMENTARIOS
9	Monte Patria	Habilitación Liceo De Emergencia Eduardo Frei Montalva, Comuna De Monte Patria	\$ 686.443	NO INICIADO	50%	Municipalidad de Monte Patria envía antecedentes de anteproyecto aprobado por D.O.M. , éstos son evaluados por SECREDUC. Se mantiene la proyección de gastos con respecto al seguimiento anterior.
10	Canela	Escuela Básica Canela Alta, Municipalidad Debe Postular Un Proyecto A Plataforma Mineduc.	\$ 2.500.000	NO INICIADO	0%	Mantiene condición con respecto al seguimiento anterior ya que la Municipalidad aun no ha presentado proyecto. SECREDUC analizará su viabilidad . Se mantiene la proyección de gastos, pero en cambio la proyección de ejecución de obra se reformula debido a la condición actual del proyecto.
11	Canela	Escuela Básica José Miguel Carrera, Municipalidad Debe Postular Un Proyecto A Plataforma Mineduc.	\$ 120.000	NO INICIADO	0%	
12	Canela	Escuela Básica Eusebio Lillo Robles, Municipalidad Debe Postular Un Proyecto A Plataforma Mineduc.	\$ 120.000	NO INICIADO	0%	
13	Canela	Escuela Básica El Totoral, Municipalidad Debe Postular Un Proyecto A Plataforma Mineduc.	\$ 200.000	NO INICIADO	0%	
14	Combarbalá	Escuela Básica Rosita O'Higgins, Municipalidad Debe Postular Un Proyecto A Plataforma Mineduc.	\$ 120.000	NO INICIADO	0%	
15	Combarbalá	Escuela Básica Pedro De Valdivia, Municipalidad Debe Postular Un Proyecto A Plataforma Mineduc.	\$ 200.000	NO INICIADO	0%	
16	Combarbalá	Escuela Básica Claudio Matte, Municipalidad Debe Postular Un Proyecto A Plataforma Mineduc.	\$ 70.000	NO INICIADO	0%	Mantiene condición con respecto al seguimiento anterior ya que la Municipalidad aun no ha presentado proyecto. SECREDUC analizará su viabilidad . Se mantiene la proyección de gastos, así como también la proyección de ejecución de obra.



Datos por Eje de Reconstrucción



Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Educación (MINEDUC)

Nº	C24OMUNA	Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa)	COSTO APROXIMADO M\$	ESTADO DE LA INICIATIVA	% DEL GASTO HOY	COMENTARIOS
17	Combarbalá	Escuela Básica Juanita Fernández Solar, Municipalidad Debe Postular Un Proyecto A Plataforma Mineduc.	\$ 85.000	NO INICIADO	0%	Mantiene condición con respecto al seguimiento anterior ya que la Municipalidad aun no ha presentado proyecto. SECREDUC analizará su viabilidad . Se mantiene la proyección de gastos, así como también la proyección de ejecución de obra.
18	Illapel	Liceo Domingo Ortiz de Rozas, Municipalidad debe postular un proyecto a plataforma MINEDUC	\$ 79.691	NO INICIADO	0%	SECREDUC realiza nuevas observaciones, con fecha 13 de Enero de 2017 quedando en espera de que la municipalidad las resuelva, es por esta razón que la proyección de gastos cambia con respecto al seguimeinto anterior, así como también la proyección de ejecución
19	Illapel	Escuela Básica San Rafael de Rozas, Municipalidad debe postular un proyecto a plataforma MINEDUC	\$ 855.270	NO INICIADO	0%	SECREDUC realiza observaciones, con fecha 13 de Octubre de 2016 quedando en espera de que la municipalidad las resuelva, es por esta razón que la proyección de gastos cambia con respecto al seguimeinto anterior, así como también la proyección de ejecución
20	Monte Patria	Liceo Presidente Eduardo Frei Montalva, Municipalidad Debe Postular Un Proyecto A Plataforma Mineduc.	\$ 2.000.000	NO INICIADO	0%	Mantiene condición con respecto al seguimiento anterior ya que la Municipalidad aun no ha presentado proyecto. SECREDUC analizará su viabilidad . Se mantiene la proyección de gastos, así como también la proyección de ejecución de obra.
21	Punitaqui	Escuela Bélgica, Municipalidad Debe Postular Un Proyecto A Plataforma Mineduc.	\$ 169.008	NO INICIADO	0%	El proyecto se encuentra elegible y en proceso de firma de convenio en Nivel Central, se mantiene proyección de gastos y de ejecución de obras.
22	Salamanca	Escuela Básica Chillepin, Municipalidad Debe Postular Un Proyecto A Plataforma Mineduc.	\$ 80.000	NO INICIADO	0%	Mantiene condición con respecto al seguimiento anterior ya que la Municipalidad aun no ha presentado proyecto. SECREDUC analizará su viabilidad . Se mantiene la proyección de gastos, así como también la proyección de ejecución de obra.
23	Vicuña	Colegio Joaquín Vicuña Larraín, Municipalidad Debe Postular Un Proyecto A Plataforma Mineduc.	\$ 150.000	NO INICIADO	0%	Mantiene condición con respecto al seguimiento anterior ya que la Municipalidad aun no ha presentado proyecto. SECREDUC analizará su viabilidad . Se mantiene la proyección de gastos, así como también la proyección de ejecución de obra.

Datos por Eje de Reconstrucción



Iniciativas Inversión Reconstrucción PEQUEÑA MINERÍA

Nº	COMUNA	Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa)	COSTO APROXIMADO M\$	CODIGO BIP	ESTADO DE LA INICIATIVA	% DEL GASTO HOY	COMENTARIOS
1	Regional	Suplemento Programa FNDR Mineros de Ley III	\$ 380.000	30313873-0	EJECUCIÓN	95%	La entrega de dichos recursos se hizo efectiva a través del eje "Fondos de Implementación" del Programa FNDR "Mineros de Ley III". En el mes de junio se entregaron \$300.000.000 y durante el mes de diciembre se entregaron \$60.000.000. El saldo pendiente se ejecutará durante marzo del año 2017 bajo el mismo eje.



Datos por Eje de Reconstrucción



FRIL Comunitario (GORE).-

Nº	COMUNA	Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa)	COSTO APROXIMADO M\$	ESTADO DE LA INICIATIVA	% DEL GASTO HOY	COMENTARIOS
1	Andacollo	Fril Comunitario: Mitigar los efectos del terremoto, tsunami y sequía, aumentando la empleabilidad local en las distintas comunas de la Región.	\$ 110.980	DETENIDO	0%	Municipio con deuda FRIL años anteriores
2	Coquimbo		\$ 234.850	EN EJECUCIÓN	0%	1 proyecto priorizado de 3 aprobados, el que se encuentra en preparación de bases de licitación
3	Paihuano		\$ 133.428	EN EJECUCIÓN	36%	3 proyectos adjudicados de 4 aprobados
4	Vicuña		\$ 144.796	EN EJECUCIÓN	0%	3 proyectos adjudicados de 4 aprobados
5	Combarbalá		\$ 258.230	EN EJECUCIÓN	22,0%	2 proyectos en ejecución, 1 ya terminado casi en un 100%
6	Monte Patria		\$ 298.506	EN EJECUCIÓN	4%	2 proyectos en ejecución.
7	Ovalle		\$ 225.457	EN EJECUCIÓN	0%	2 proyectos en ejecución, con entrega de terreno a fines de diciembre.
8	Punitaqui		\$ 224.576	EN EJECUCIÓN	0%	3 proyectos en proceso de licitación.
9	Río Hurtado		\$ 162.764	EN EJECUCIÓN	41%	2 proyectos en ejecución, proximos a finalizar ambos
10	Canela		\$ 235.795	EN EJECUCIÓN	11%	
11	Illapel		\$ 291.047	EN EJECUCIÓN	10,2%	1 proyecto contratado de 7 aprobados
12	Los Vilos		\$ 118.408	EN EJECUCIÓN	14,10%	2 proyecto contratado de 2 aprobados
13	Salamanca		\$ 195.313	EN EJECUCIÓN	7,85%	1 proyecto contatado de 3 aprobados



RESUMEN ESTADO DE AVANCE

VIVIENDA

SALUD

EDUCACIÓN Y
CULTURA

INFRAESTRUCTURA Y
ESPACIO PÚBLICO

ECONOMÍA

PESCA
ARTESANAL

PEQUEÑA
MINERÍA

AGRICULTURA

BORDE
COSTERO

División de
Gobierno
Interior

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

PORTAL INFORMACIÓN ÚNICA --- EMERGENCIAS ---

En la siguiente plataforma encontrará información territorial de la zonas afectadas por la emergencias de nuestro país.

Esta herramienta contiene datos únicos actualizados por los diferentes servicios públicos, con el objetivo de orientar de manera eficaz la toma de decisiones por parte de las autoridades, y así garantizar soluciones efectivas a la ciudadanía durante una urgencia social.

División de Gobierno Interior
Subsecretaría del Interior

CONTROL
BENEFICIOS

PORTAL
RECONSTRUCCIÓN

PORTAL
CAMPAMENTOS

ESTADISTICAS

PORTAL
MAPAS ONLINE



Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Reporte mensual para el Consejo de Ministros para la Reconstrucción

- Integrada por las carteras de Interior, Hacienda, Economía, Educación, Salud, Obras Públicas, Vivienda y Desarrollo Social.
- Reporta avances Planes de Reconstrucción: Aluvión Atacama, Aluvión Tocopilla, Erupción Calbuco, Erupción Chaitén, Incendio Valparaíso, Terremoto 27F, Terremoto Arica, **Terremoto Coquimbo**, Terremoto Tarapacá y Terremoto Tocopilla.
- Información debe actualizarse los días 20 de cada mes.

RESUMEN ESTADO DE AVANCE



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE RECONSTRUCCIÓN

Esta Plataforma es un instrumento de seguimiento y monitoreo de todos los procesos de reconstrucción que se están desarrollando en las Regiones afectadas por Desastres Socio Naturales.

Se compone por tres temáticas: Iniciativas de Inversión, subsidios de vivienda y los compromisos sectoriales asociados a reconstrucción.

El objetivo de esta plataforma es poder contar con los datos y cifras actualizados por los diferentes sectores, con el propósito de obtener la información fidedigna y clara de los procesos de reconstrucción.

Iniciativas | Vivienda | Compromisos


Reporte Comunal

Ministerio del Interior y Seguridad Pública – Unidad de Coordinación de Reconstrucción e Información Territorial. Ejecutada en 0.0960 segundos, usando 3.88MB.

RESUMEN ESTADO DE AVANCE



Plataforma de Seguimiento del Ministerio del Interior No incluye subsidios MINVU para Reconstrucción

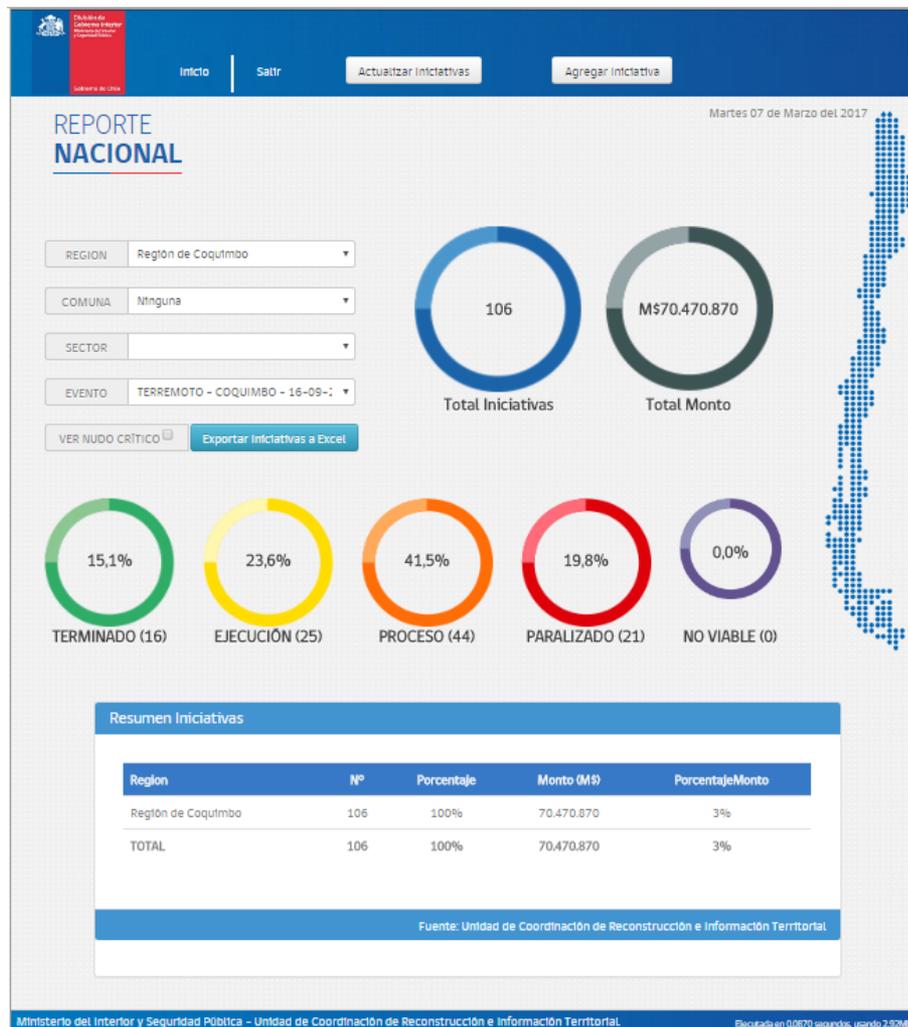



Gracias

Gobierno Regional de Coquimbo

Marzo 2017

